



DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 12/01/2021
Verslagnummer: 0428-210112-05

Uitgiftedatum verslag: 12/01/2021

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbrugghen
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
T: 083 21 35 27 E: btv.namur@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0428

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: LUC BRIJSSINCK
Adres: BLAUWESTEENSTRAAT 3, 2550 KONTICH
Naam eigenaar, uitbater of beheerder:
Adres:
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: LUC BRIJSSINCK
Adres: BLAUWESTEENSTRAAT 3, 2550 KONTICH
BTW-nummer: 0831979094

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam:
Adres:
EAN- code:
Nummer teller: 50145389-2008
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: werkeenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5)
Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

RE06_02-08_01-15 09/20

1 / 3


Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 230V
 Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 16 mm²
 Type aardelektrode: Aardingspen
 Aantal borden: 2

Nominale waarde bescherming aansluiting: Max. 40A
 Type algemene schakelaar: 4P 40A/300mA
 Type aardverbindingssysteem: TT
 Aantal stroombanen: 25 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A,
 beschermde stroombanen: Zie schema's

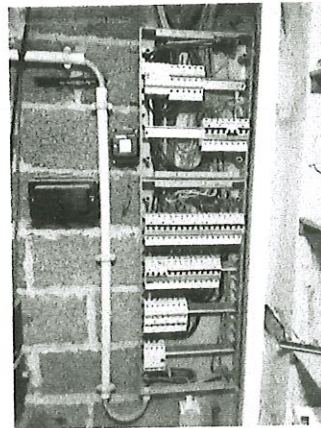

Document met uitwendige invloeden: Present
 Documenten van de veiligheidsinstallaties: Geen meegedeeld
 Documenten van de kritische installaties: Geen meegedeeld
 Situatieplan van de aardverbindingen: n.v.t.

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 23 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 0,5 MOhm
 Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK
 Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK
 Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 12/01/2026



Handtekening van de technisch verantwoordelijke (of namens de technisch verantwoordelijke):
