

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection: 28/10/2025

Inspecteur: Dylan Hoebeeck

Mentor:
Installateur: MBP sprl

Étiquette d'identification: 01/1.2

Référence client: 1

N° TVA:BE 0448 140 889

 Marque et type d'appareil de mesure:
 Metrel Eurotest ET61557

Numéro de serie: 17470016

Date rapport: 28/10/2025

Adresse de l'installation

Rue	Chaussée de Marche
Numéro	288
Boîte	01/1.2
Postcode	5100
Commune	Jambes
Pays	Belgique

Propriétaire

Nom

Rue

Numéro

Boîte

Postcode

Commune

Pays

Installateur

Nom

N° TVA

Numéro de téléphone

E-mail

MBP sprl

BE 0448 140 889

+32 475 72 59 98

mbp@skynet.be

Type : appartement

Image du tableau de repartition et de manoeuvre:

EAN : 541449045005814026

N° compteur : 1SAG1200342070


Type de contrôle:

L'installation a-t-elle été entamée avant le 01/06/2023?

Non

Contrôle de conformité d'une nouvelle installation domestique selon (AR 08/09/2019) - RGIE Livre 1 - 6.4. et 4.2.4.3.

Distributeur: ORES

Tension: 1N400V

Liaison comp / tableau: 10 mm²

Protection Max: 40 A

Nombres tableaux: 2

Nombre de circuits: 2+18


Prise de terre: Boucle

Ri général: 89,6 MΩ

RE: 2,53 Ω

OK

OK



DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - autres (A)	It	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	40	TD1	22,5kA2s (3000A)	A	Tous	NA	NA
30	40	TD1	22,5kA2s (3000A)	A	1	NA	NA
-	-	-	-	-	-	-	-
30	40	TD2	22,5kA2s (3000A)	A	4	NA	NA
30	40	TD2	22,5kA2s (3000A)	A	5	NA	NA
30	40	TD2	22,5kA2s (3000A)	A	4	NA	NA

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm²)
Voir schéma en annexe	-	-	-	-	-
Contrôle visuel (général)	OK	Contact direct	OK	Contact indirect	OK
Raccordement	OK	schéma en annexe par Aceg asbl			
Liaisons équipotentiellees	BON	Section des conducteurs	OK		
Continuité	OK	Éclairage / machines	NVT		

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

- N13 La salle de bain n'est pas complètement terminée. Baignoire et/ou douche doivent être placés.
- N24 Cuisine équipée et/ou appareils de cuisine non placés.
- N5 L'éclairage n'est pas définitivement installé.

nota/note 12: L'installation électrique n'est pas sous tention. Le bon fonctionnement des différentiels n'a pas pu être testé

CONCLUSION

- ☒
- L'installation électrique est conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1.** La prochaine visite de contrôle est à prévoir avant le 28/10/2050
- ☒
- Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que les bornes d'entrée du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage.
- ☒
- Le(s) schéma(s) unifilaires et le(s) plan(s) de position ont été signés par l'organisme agréé.
- Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut etre diffusé en copie.

Nombre d'annexe(s):

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

Durée de l'inspection: de 10:30 à 11:00

L'inspecteur Dylan Hoebeeck

Signature EMPLOYE:

Hoebeeck


Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.2.
Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.

Qualité
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

Pour toute question ou pour les conditions générales, veuillez consulter le site www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Feuille de route pour une installation qui est conforme:			
Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler.	Le prochain contrôle périodique est prévu pour 28/10/2050	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.

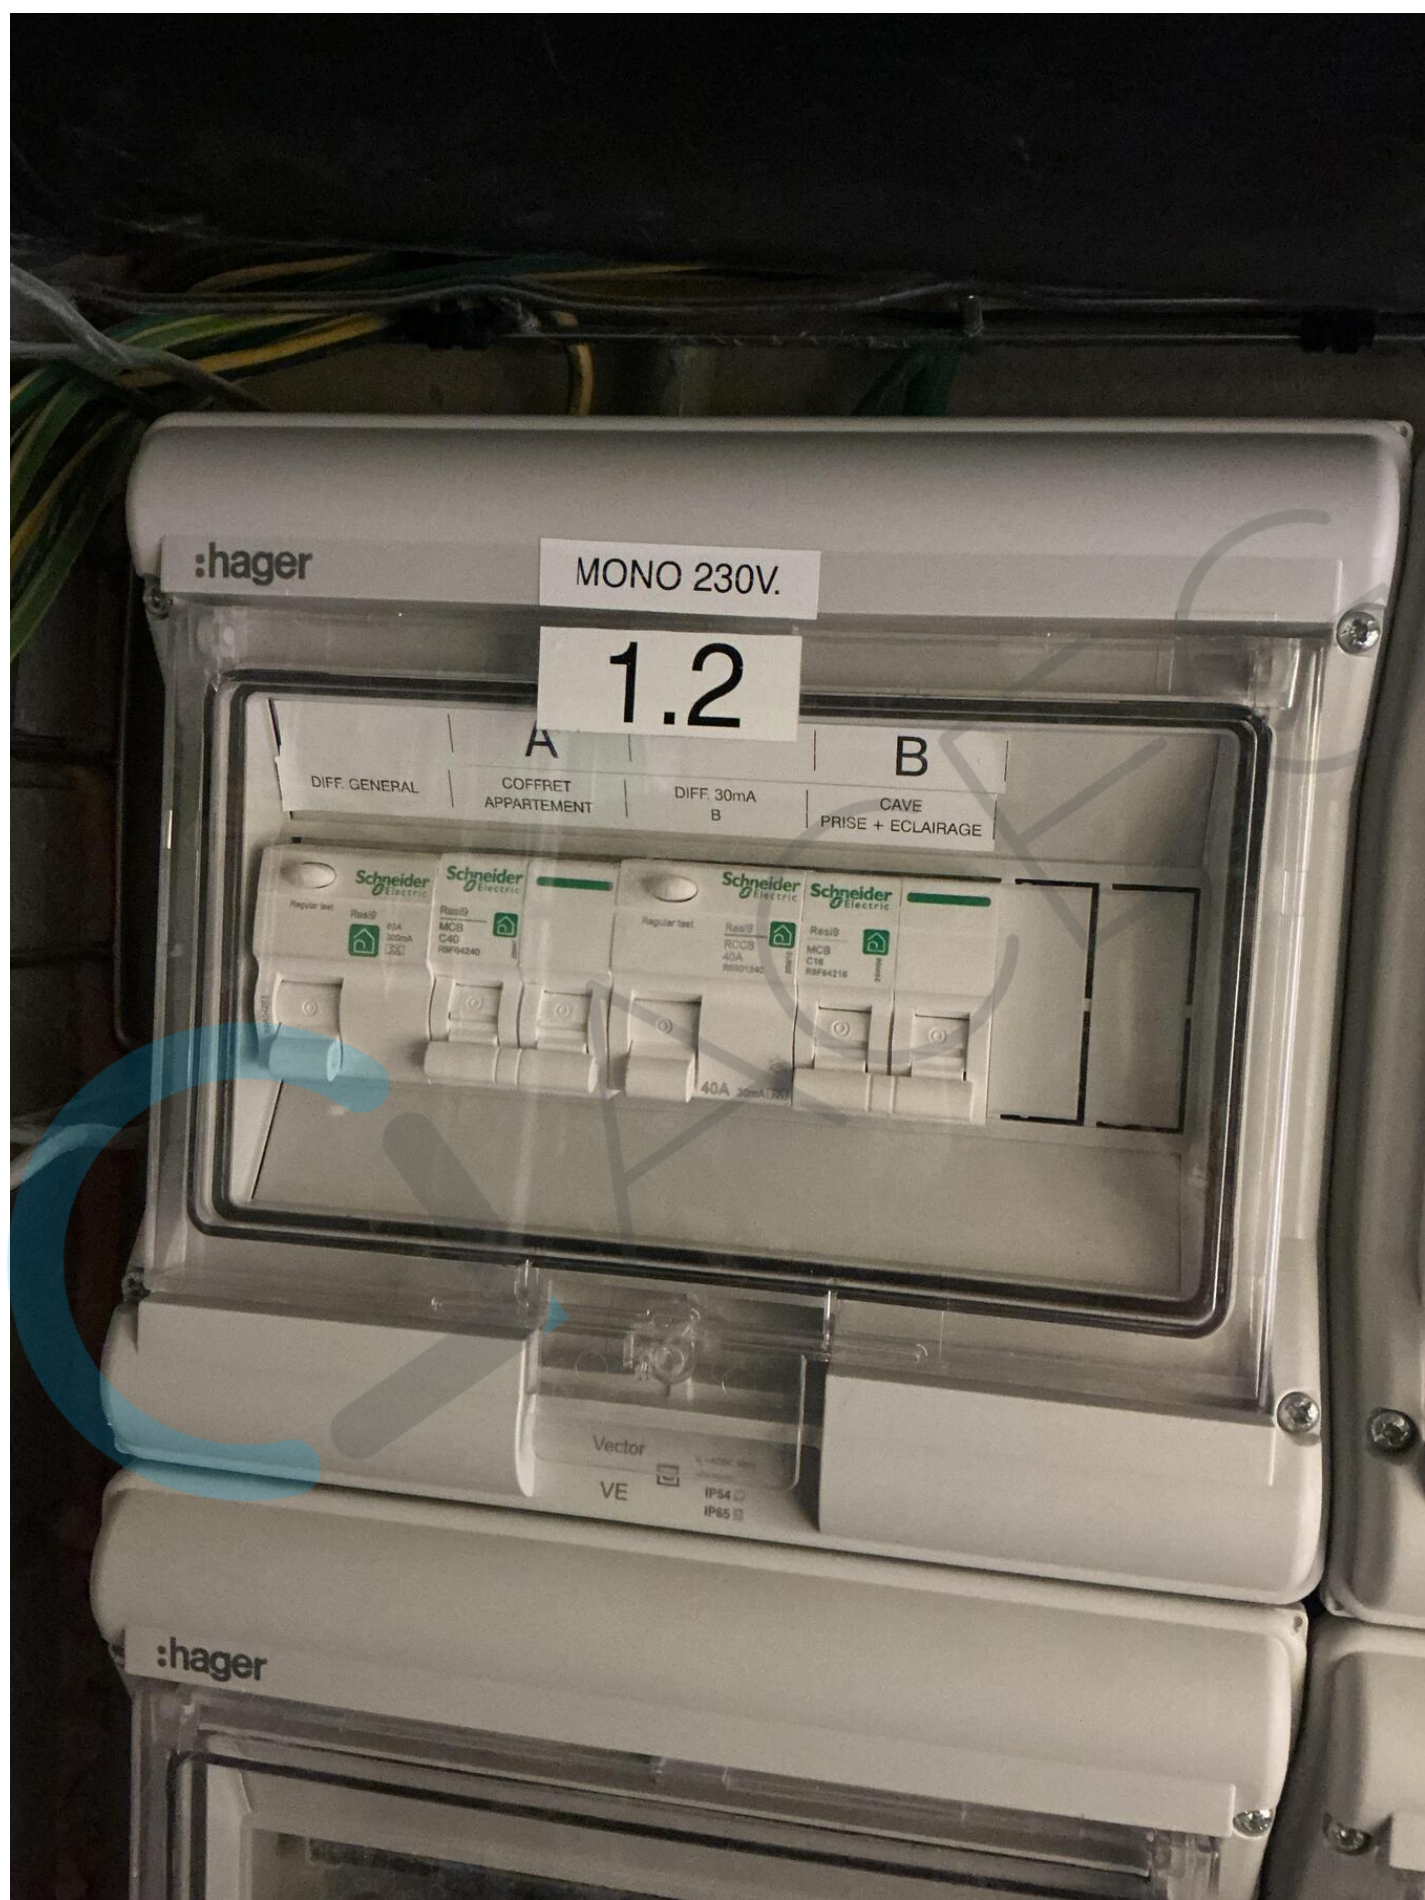







ACEG 147
 Orgaanbeuringsorganisme / Organisme agencie
Dylan Hoebeek

28/10/25

Installateur
Meca-Bio-Pole srl
Rue de l'Abbaye 24
1457 Walhain
GSM: 0475 72 59 98
e-mail: mbp@skynet.be
TVA BE 0448.140.889

p. 1/2
Schéma unifilaire
Date: 28-10-25
2 x 230V ~ 50Hz

